Государственный контракт без подписи Д.Суханова и Ю.Остапченко

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

Опубликован предъявленный застройщиками государственный контракт, в котором отсутствуют подписи должностных лиц

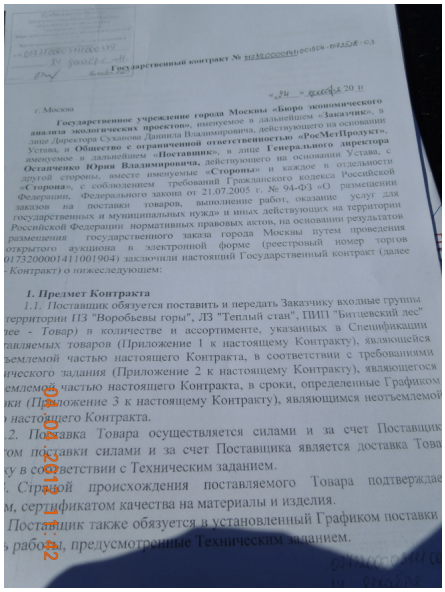

Государственный контракт №

г. Москва

«24» февраля 20 11

Государственное учреждение города Москвы «Бюро экономического анализа экологических проектов», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Директора Суханова Данила Владимировича, действующего на основании Устава, и **Общество с ограниченной ответственностью «РосМетПродукт»**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице **Генерального директора Остапченко Юрия Владимировича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**» и каждое в отдельности «**Сторона**», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме (реестровый номер торгов 0173200001411001904) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику входные группы территории ПЗ "Воробьевы горы", ЛЗ "Теплый стан", ПИП "Битцевский лес" (далее - Товар) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в соответствии с требованиями технического задания (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, определенные Графиком поставки (Приложение 3 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Датой поставки силами и за счет Поставщика является доставка Товара Заказчику в соответствии с Техническим заданием.

1.3. Страной происхождения поставляемого Товара подтверждается сертификатом качества на материалы и изделия.

1.4. Поставщик также обязуется в установленный Графиком поставки выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием.

Государственный контракт без подписи Д.Суханова и Ю.Остапченко

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

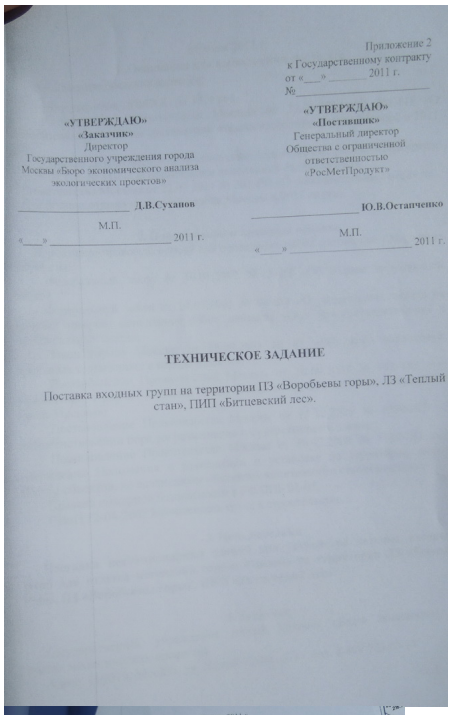

Приложение 2
к Государственному контракту
от «___» _____ 2011 г.
№ _____

«УТВЕРЖДАЮ»
«Заказчик»
Директор
Государственного учреждения города
Москвы «Бюро экономического анализа
экологических проектов»

_____ Д.В.Суханов
М.П.
«___» _____ 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
«Поставщик»
Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«РосМетПродукт»

_____ Ю.В.Остапченко
М.П.
«___» _____ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка входных групп на территории ПЗ «Воробьевы горы», ЛЗ «Теплый стан», ПИП «Битцевский лес».

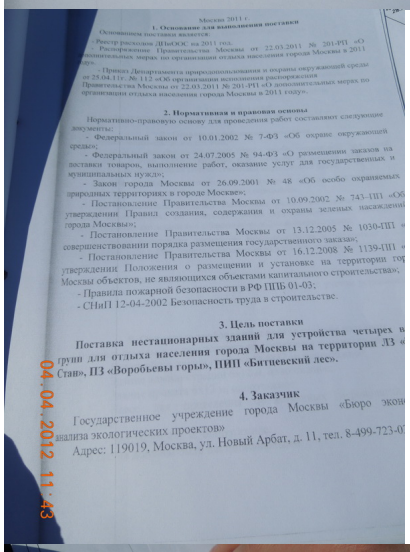

Москва 2011 г.

1. Основание для выполнения поставки

Основанием поставки является:
- Реестр расходов ДПиООС на 2011 год.
- Распоряжение Правительства Москвы от 22.03.2011 № 201-РП «О дополнительных мерах по организации отдыха населения города Москвы в 2011 году».
- Приказ Департамента природопользования и охраны окружающей среды от 25.04.11г. № 112 «Об организации исполнения распоряжения Правительства Москвы от 22.03.2011 № 201-РП «О дополнительных мерах по организации отдыха населения города Москвы в 2011 году».

2. Нормативная и правовая основы

Нормативно-правовую основу для проведения работ составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»;
- Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»;
- Постановление Правительства Москвы от 13.12.2005 № 1030-ПП «О совершенствовании порядка размещения государственного заказа»;
- Постановление Правительства Москвы от 16.12.2008 № 1139-ПП «Об утверждении Положения о размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства»;
- Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.

3. Цель поставки

Поставка нестационарных зданий для устройства четырех входных групп для отдыха населения города Москвы на территории ЛЗ «Теплый Стан», ПЗ «Воробьевы горы», ПИП «Битцевский лес».

4. Заказчик

Государственное учреждение города Москвы «Бюро экономического анализа экологических проектов»
Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, тел. 8-499-723-0

04.04.2012 11:43

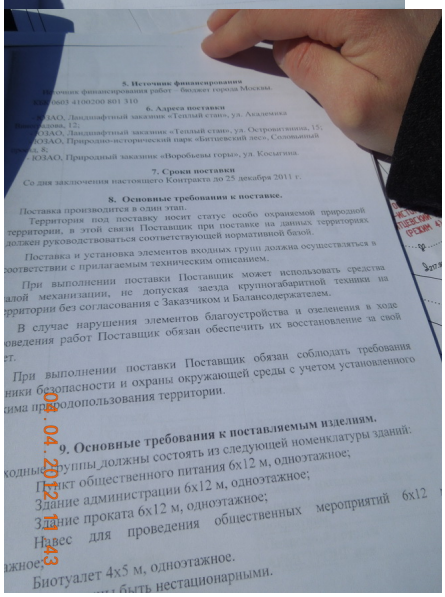

5. Источник финансирования

Источник финансирования работ – бюджет города Москвы.
КОСГУ 0603 4100200 801 310

6. Адреса поставки

ЮЗАО, Ландшафтный заказник «Теплый стан», ул. Академика Янгеля, 12;
ЮЗАО, Ландшафтный заказник «Теплый стан», ул. Островитянина, 15;
ЮЗАО, Природно-исторический парк «Битцевский лес», Соловьиный проезд, 8;
ЮЗАО, Природный заказник «Воробьевы горы», ул. Косыгина.

7. Сроки поставки

Со дня заключения настоящего Контракта до 25 декабря 2011 г.

8. Основные требования к поставке.

Поставка производится в один этап.

Территория под поставку носит статус особо охраняемой природной территории, в этой связи Поставщик при поставке на данных территориях должен руководствоваться соответствующей нормативной базой.

Поставка и установка элементов входных групп должна осуществляться в соответствии с прилагаемым техническим описанием.

При выполнении поставки Поставщик может использовать средства малой механизации, не допуская заезда крупногабаритной техники на территории без согласования с Заказчиком и Балансодержателем.

В случае нарушения элементов благоустройства и озеленения в ходе проведения работ Поставщик обязан обеспечить их восстановление за свой счет.

При выполнении поставки Поставщик обязан соблюдать требования техники безопасности и охраны окружающей среды с учетом установленного режима природопользования территории.

9. Основные требования к поставляемым изделиям.

Входные группы должны состоять из следующей номенклатуры зданий:
Пункт общественного питания 6х12 м, одноэтажное;
Здание администрации 6х12 м, одноэтажное;
Здание проката 6х12 м, одноэтажное;
Навес для проведения общественных мероприятий 6х12 м, одноэтажное;
Биотуалет 4х5 м, одноэтажное.
Здания должны быть нестационарными.

04.04.2012 11:43

Государственный контракт без подписи Д.Суханова и Ю.Остапченко

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

Внешний вид должен соответствовать эскизному проекту.

Технические характеристики поставляемых объектов.

Наименование	Наименование показателя	Характеристика
Административно-бытовое здание	Наружная стена	Панели (вагонка, стилизованная под брус; деревянный каркас – брус 147x42 мм, обработка огне-биозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм).
	Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100x50 мм, обработка огне-биозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 100 мм). Внутренние двери – деревянные 2000x800, шпонированные.
	Перекрытия	Лаги – брус 200x50 мм, перемычки лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм.
	Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
	Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
	Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
	Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
	Внутренняя отделка: *стены*	Декоративные панели на основе цеметно- магниевых плит с акриловым износостойким покрытием.
	потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или

04.04.2012 11

	полы	эквивалентный. Обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм, ламинат (33 класс).
	Дверь входная	Металлическая 2000x900 мм, утепленная.
	Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом, пластиковые. Размеры – 1000x1200 мм (6 шт), 2000x1200 мм (1шт) и 3000x600 мм (2 шт).
	Подоконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
	Отлив	Металлический, с полимерным покрытием.
	Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов).
Пункт обеспечения ителей одуктами	Наружная стена	Панели (вагонка, стилизованная под брус; деревянный каркас – брус 147x42 мм, обработка огне-биозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм).
	Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100x50 мм, обработка огне-биозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм). Внутренние двери – деревянные 2000x800, шпонированные.
	Перекрытия	Лаги – брус 200x50 мм, перемычки лаг, утеплитель

04.04.2012 11:43

Монтажный материал	(«ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм. Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: *стены*	Декоративные панели на основе цеметно- магниевых плит с акриловым износостойким покрытием.
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
полы	Обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм, ламинат (33 класс).
Дверь входная	Металлическая 2000x900 мм, утепленная.
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом, пластиковые. Размеры – 1000x1200 мм (6 шт), 2000x1200 мм (1шт) и 3000x600 мм (2 шт).
Подоконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
Отлив	Металлический, с полимерным покрытием.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная

Государственный контракт без подписи Д.Суханова и Ю.Остапченко

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

Здание проката		система трубопроводов)
	Наружная стена	Панели (вагонка, стилизованная под брус; деревянный каркас – брус 147х42 мм, обработка огнебиозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм).
	Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 100 мм). Внутренние двери – деревянные 2000х800, шпонированные
	Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм.
	Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
	Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
	Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
	Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
	Внутренняя отделка: *стены*	Декоративные панели на основе цеметно- магниевых плит с акриловым износостойким покрытием.
	потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
	полы	Обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм, ламинат (33 класс).
	Дверь входная	Металлическая 2000х900 мм,

	Окна	Утепленные. Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом, пластиковые. Размеры – 1000х1200 мм (4 шт) и 6000х2200 мм (1 шт) – витраж с дверью.
	Подоконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
	Отлив	Металлический, с полимерным покрытием.
	Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу, освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов)
Здание для общественных перегрузчиков	Стена	Панели (ЦСП – 12 мм с двух сторон; деревянный каркас – брус 147х42 мм, обработка огнебиозащитным составом.
	Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг.
	Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
	Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
	Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
	Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
	Полы	Настил пола - обрезная доска 50 мм.
	Опорные столбы	Брус 150х150 мм, h=3000 мм.
	Опорные столбы для скамеек	Брус 100х100 мм, h=500 мм.
	Перила	Деревянные
	Балясины	Брус 50х40мм.

	Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Смонтированная электропроводка, включая розеточную группу.
	Наружная стена	Панели (вагонка, стилизованная под брус, деревянный каркас – брус 147х42 мм, обработка огнебиозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм).
	Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом; утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 100 мм). Внутренние двери – деревянные 2000х800, шпонированные.
	Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм.
	Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
	Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
	Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
	Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
	Внутренняя отделка: *стены*	ЦСП 12 мм, пластиковые панели.
	потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный h=2.7 м.
	полы	Обрезная доска 50 мм, ЦСП 12 мм, плитка.

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

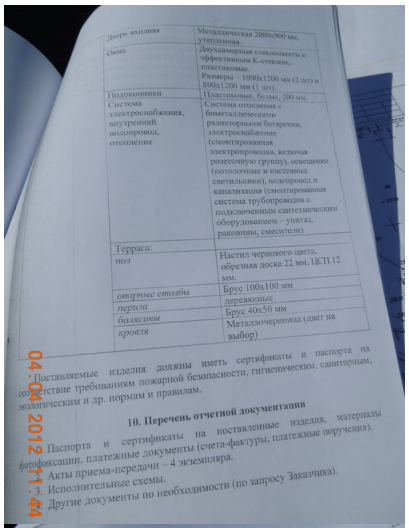

Дверь входная	Металлическая 2060x860 мм, утепленная.
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом, пластиковые. Размеры – 1000x1200 мм (2 шт) и 800x1200 мм (1 шт).
Подоконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов с подключенным сантехническим оборудованием – унитаз, раковины, смесители)
Терраса:	
пол	Настил чернового цвета, обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм.
опорные столбы	Брус 100x100 мм
перила	деревянные
балясины	Брус 40x50 мм
кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)

Поставляемые изделия должны иметь сертификаты и паспорта на соответствие требованиям пожарной безопасности, гигиеническим, санитарным, экологическим и др. нормам и правилам.

10. Перечень отчетной документации

1. Паспорта и сертификаты на поставленные изделия, материалы фотофиксации, платежные документы (счета-фактуры, платежные поручения).
2. Акты приема-передачи – 4 экземпляра.
3. Исполнительные схемы.
4. Другие документы по необходимости (по запросу Заказчика).

04.04.2012 11:44



11. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на весь Товар и срок не менее двух лет со дня подписания документов, подтверждающих приемку Товара.

В случае поставки не качественного изделия, выявления дефектов в ходе эксплуатации, Поставщик производит замену аналогичного изделия за свой счет в пределах сроков гарантийного обязательства.

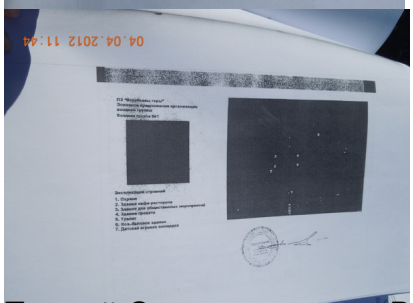

Теплый Стан, академика Виноградова:

ул.Миклухо-Маклая:

Теплый Стан:

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

Ситуационный план по Соловьиному проезду у строителей отсутствовал
